

Convenio FAI - Nº	Convenio FINEP - Nº	data assinatura do convenio	obs
1416	01.09.0476.00	09/10/2009	Encerrado: RTF >> Set 2021
1481	01.11.0055.00	23/03/2011	Encerrado: RTF >> Jul/2022
1406 >> Sapiens 1105	01.09.0354.00	09/09/2009	Encerrado: RTF >> Fev/23
Sapiens 11.417	01.18.0153.00 (C Convite 01/2018)	18/12/2018	Encerrado: RTF >> Out 2023
1597 >> Sapiens 1158	01.12.0510.00	21/12/2012	Encerramento em Dez/23 com RTF enviado em Abr/2024
1468 >> Sapiens 1549	01.10.0625.00	01/12/2010	*
1556 >> Sapiens 595	01.12.0048.00	09/02/2012	*
Sapiens - 9557	01.16.0014.00 (C.Convite 01/2014)	19/04/2016	Aguardando liberação parcial de Recursos
Sapiens - 11.542	01.19.0189.00 (CTINFRA 03/2018 - Reformas 8 Bioterios de Apoio)	20/12/2019	Aguardando liberação integral de Recursos
Sapiens - 15.481	01.23.0061.00 - (CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/AMBIENTES CONTROLADOS E SALAS LIMPAS)	26/06/2023	*

It	conv FAI	Licitação	Descrição/obra	Status da licitação/estagio da obra/planejamento 2024	Empresa Contratada/conclusão da etapa /obra	previsão de entrega da obra/empresa	Área Efetiva e/ou equivalente (m²)	nº CNO / INSS	Recursos FINEP / contratado - (R\$)	Outras Fontes (Projetos e/ou Proprios) - (R\$)	V Total Contratado (CI + R\$	centro vinculado
1	Conta 2930	SL - Contratação Direta	Ampliação Predio FAI 01 (c/ 2 pavimentos) - V Base = R\$ 1.601.150,38	Em montagem de Edital	Empresa: ???	execução em 300 dias	321,51	Cadastromento no CNO será via UFSCAR	Conta 2930 (Não FINEP)	1.601.150,38	1.601.150,38	Ampliação FAI 01
2	11.543	CONC 05/2024	Reforma de 6 Bioterios de Apoio ( Predio DCF) = V Base = R\$ 209.092,98 - abertura em 27/05/2024 -	Proposta em analise	Empresa: ???	execução em 120 dias	Somar Areas dos 6 Bioterios	Cadastromento no CNO será via UFSCAR	209.092,98		209.092,98	CCBS
3	15.053	CONC 04/2024	Reforma LCE - Prof Botta - V Base = R\$ 299.898,29 - abertura em 23/05/2024 -	Proposta em analise	Empresa: ???	execução em 120 dias	295,00	Cadastromento no CNO será via UFSCAR	299.898,29		299.898,29	CCET
4	Não FINEP - concv 13.840	CONC 02/2024 (Projetos Lagoa do Sino)	Contratação Projetos Executivos - Lagoa do Sino/SeGEF - V base = R\$ 528.846,95 - abertura em 24/05/2024 -	Proposta em analise	Empresa: ???	Execução em 180 dias	Contratação Projetos Executivos	**	Não FINEP	528.000,00	528.000,00	Campus Lagoa do Sino
5	Prodin nº 02/2023 concv 15.750	CONC 03/2024	Conclusão do Predio DeMEC x PRODIN (licitação via FAI) - V Base = R\$ 2.009.646,69 - abertura em 15/05/2024 -	Proposta em analise	Empresa: ???	execução em 300 dias	527,12	Cadastromento no CNO será via UFSCAR	Prodin - nº 02/2023 - Conv. 15.750	2.009.646,69	2.009.646,69	CCET
6	Não-FINEP - concv FAI 2930	SL - Contratação Direta	Rede eletrica - Alimentação - Predio INFRATEC - V Base = R\$ 166.811,70	em fase de contratação	Empresa: JNA	execução em 60 dias	Rede Aérea	**	Conta 2930 (Não FINEP)	164.994,61	164.994,61	CCET
7	15.481	CONC 01/2024	Reforma do Laboratorio LMBBM (DCF - Proª Heloisa) - V base R\$ 224.897,41 >> abertura das Propostas: 16/02/2024 - Assinatura do CI em 16/04/2024 - Inicio da Obra em 02/05/2024	Em Andamento (fiscalização empresa Granuzzo Marçal + Eng. Eletrica FAI)	Empresa: CS Engenharia	ago-24	85,21	Cadastromento no CNO será via UFSCAR	214.390,50		214.390,50	CCBS
8	1468 + 9557	CONC 03 /2023	Inclusão Rota de Fuga/Passarela BIOTROP - V Base = R\$ 739.008,09 >> abertura Habilitações/Propostas: 04/08/2023 - Valor do CI = R\$ 590.047,17 >> Contratação em 11/10/2023 e inicio da Obra em 30/10/2023	Em Andamento (fiscalização empresa AGP + Eng. Eletrica FAI) e Fiscalização da Granuzzo Marçal a partir de 19/03/24	Empresa: JNA (CI + 1ª TA)	ago-24	120,00	Cadastromento no CNO será via UFSCAR e não mais pela FAI!	673.518,90		673.518,90	CCET
9	1556	CONC 02 /2023	Inclusão da Conclusão do INFRATEC - V Base = R\$ 2.299.198,97 >> abertura Habilitações/Propostas: 04/08/2023 - Valor do CI = R\$ 1.839.355,85 >> Contratação em 11/10/2023 e inicio da Obra em 30/10/2023	Em Andamento (fiscalização empresa AGP + Eng. Eletrica FAI) e Fiscalização da Granuzzo Marçal a partir de 19/03/24	Empresa: JNA (CI + 1ª TA)	nov-24	684,60	Cadastromento no CNO será via UFSCAR e não mais pela FAI!	2.077.104,88		2.077.104,88	CCET
10	1556 + 9557	CONC 01 /2023	Conclusão do BIOTERIO CENTRAL - V Base = R\$ 3.888.259,87 >> abertura Habilitações/Propostas: 04/08/2023 - Valor do CI = R\$ 3.498.267,83 >> Contratação em 11/10/2023 e inicio da Obra em 30/10/2023	Em Andamento (fiscalização empresa AGP + Eng. Eletrica FAI) e Fiscalização da Granuzzo Marçal a partir de 19/03/24	Empresa: JNA	out-24	512,34	Cadastromento no CNO será via UFSCAR e não mais pela FAI!	3.498.267,83		3.498.267,83	CCBS
11	1556	CONC 03/2022	Reforma das Instalações Elétricas - Predios do DEMA - Valor Base = R\$ 1.136.888,00 - Abertura das habilitações em 20/01/2023 - Abertura das propostas: 06/03/2023 >> Inicio efetivo da Obra: 13/03/2023	Concluída (fiscalização Eng. Rafael - Eletrica FAI)	07/03/2024 (Termo de Recebimento Provisório: xxxxx/2024?)		3.164,05	Cadastromento no CNO será via UFSCAR e não mais pela FAI!	1.228.171,50		1.228.171,50	CCET
12	Conv 13.840 (não FINEP)	CONC 02/2022	Lab Multiusuário - CCN - Campus Lagoa do Sino = Valor Base = R\$ 1.780.875,87 - abertura das Habilitações: 30/05/2022 - Abertura das propostas comerciais em 07/06/2022 >> Valor do CI = R\$ 1.756.863,43 >> contratação em 28/06/2022 e inicio da obra em 21/07/2022	Concluída (fiscalização empresa AGP + Eng. Eletrica FAI)	30/10/2023 (Termo de Recebimento Provisório: 14/12/2023)	Sate Tecnologia e Serviços Ltda >>> CI + 1ª TA + 2ª TA+3ª TA + 4ª TA + 5ª TA	256,61	Cadastromento no CNO será via UFSCAR e não mais pela FAI!	Conv 13.840 (Lagoa do Sino) >> não FINEP	1.693.215,21	1.693.215,21	Campus Lagoa do Sino
13	Conv 14.696 (não FINEP)	SL 02 /2023	Reforma das Instalações Elétricas - Predio CCDM (prof Guilherme Koga) - V Base = R\$ 160.550,90 - Abertura Habilitações: 02/05/23 - Abertura propostas: 12/05/2023 - Assinatura do contrato: 05/06/2023 >>> Inicio Obra: 19/06/2023	Concluída (fiscalização Eng. Rafael - Eletrica FAI)	06/10/2023 (Termo de Recebimento Provisório: 20/10/2023)	Empresa: Andre Hoffman Rodrigues - ME (CI + 1ª TA)	1.040,00	Cadastromento no CNO será via UFSCAR e não mais pela FAI!	Conv 14.696 (não FINEP)	122.676,27	122.676,27	CCET
14	Conv RTI nº 14.200 (não FINEP)	Contrato CD nº 012/2022	Acesso viário da EE de Valparaíso (RTI 14.200) - Valor Base = R\$ 800.202,26 (SL 05/2022 - Deserta novamente em 23/09/2022) - Ata de inicio de obra assinada em 23/12/2022 >> Inicio efetivo da obra: 16/01/2023	Concluída (fiscalização: empresa Hortolaní & Avellar - Eng. Pedro Hortolaní)	Conclusão em 24/04/23	Noroeste Paulista >>> CI + 1ª TA + 2ª TA + 3ª TA	Extensão de 1,2 Km (n) ci área = 7.561,45 m²	Cadastromento no CNO será via UFSCAR e não mais pela FAI!	Conv 14.200 (RTI) - não FINEP (vinc. 24/04/2023)	859.190,70	859.190,70	EE Valparaíso
15	1597 + 11.417	CONC 03/2021	Conclusão da Ampliação do Lab. de Pesq. em Matemática, com 2 pavimentos e 955,28 m2 - LPGA (1997) >> V Base = R\$ 1.651.730,76 >> Abertura das Habilitações em 25/08/2021 >> Abertura das propostas em 17/09/21 >> Valor CI = R\$ 1.398.985,27, >> contratação em 18/11/2021 >> inicio da obra em 06/12/2021	Concluída (fiscalização empresa AGP + Eng. Eletrica FAI)	03/03/2023 (Termo de Recebimento Provisório: 13/03/2023)	JNA >>> CI + 1ª TA + 2ª TA + 3ª TA + 4ª TA + Rreequilíbrio em fev/23	955,28	CNO 90.009.24350/76	1.790.016,94		1.790.016,94	CCET

Obras executadas e em andamento - período: 2008 à 2024		Obras CTINFRA/FINEP e/ou Outros Convenios		Posição em:		29/05/2024						
16	Conv. JLE/PP - ribofrmp	Pregão nº 19/2022 (Campus Araras)	Serviço de Cercamento do Campus de Araras - Valor Base = R\$ 659.677,65 >> Abertura do Pregão: 29/03/2022 - Valor CI = R\$ 546.888,00 - assinatura do contrato e início de obra em 18/04/2022	Concluída (fiscalização empresa CONSTRIX - Arq. Nickolas)	15/11/2022	Empresa AURUS	Comprimento do Cercamento = 2.072,87 m	Serviço Isento de cadastramento no CNO	Conv 14.199 (Araras) >> não FINEP	569.422,14	569.422,14	CCA - Araras
17	1597 + 11.417	CONC 02/2021	Genética - Conclusão da obra (conv. 1597 e 11.417) - V.Base: R\$ 1.644.024,63 - data base: Dez/20 - Abertura das habilitações: 19/04/21; Abertura das Propostas: 13/05/2021 >> Contratação em 30/07/2021 (CI = R\$ 1.362.675,13) - início efetivo da obra: 16/08/2021	Concluída (fiscalização empresa AGP + Eng. Elétrica FAI)	16/09/2022 (Termo de Recebimento Provisório: 04/10/2022)	JNA - (CI + Reequilíbrio Contratual + 1º TA + 2º TA + 3º TA + 4º TA ADM + 5º TA)	1.150,00	CNO 90.005.21881/70 (mesmo da CONC 03/2020 - rescindida)	1.678.077,24		1.678.077,24	CCBS
18	1556 + 11.417	CONC 01/2021	IBEV - Conclusão da Obra - Ab = 661,39 m2 (V. Base = R\$ 1.326.840,02 - out/20) - Abertura das habilitações: 05/02/2021; Abertura das Propostas Comerciais: 16/03/2021 - data de assinatura: 14/04/2021 - Valor do CI = R\$ 1.066.196,22 >> início efetivo da obra: 03/05/2021	Concluída (fiscalização empresa AGP + Eng. Elétrica FAI)	29/04/2022 (Termo de Recebimento Provisório: 06/06/2022)	GG Ribeirão Construções (CI + 1º TA + Reequilíbrio + 2º TA)	661,39	CNO 90.006.65986/77	1.233.807,72		1.233.807,72	CCET
19	REVOGADO	Pregão Eletrônico PE 072/2021 (Prodin 02/2020 - TED/MEC 8891)	Serviço para Ampliação do Parque de Usinas Fotovoltaicas - 2 UFVs c/ PI = 447,12 KwP (Estacionamentos AT 07 e Petrobras) - Prodin 02/2020 - conv. 13.369 - Valor Base = R\$ 1.796.080,43 >> abertura 22/10/2021 - Valor Contratado/Empresa GC = R\$ 1.409.908,99	Pregão 072/2021 - Revogado	31/03/2022 (PE 072/2021 revogada)	Empresa GS	Cobertura de Estacionamentos A = 2.116,00 m²	**	Conv 13.369 (Prodin 02/2020) >> não FINEP	0,00	-	Institucional
20	9557	CONC 03/2019	LIEP - Conclusão da obra (C. Convite 01/2014) - abertura em 19/12/2019 >> abertura das propostas: 28/02/20 >> data da assinatura do contrato: 13/05/2020 >> empresa GRIFFO >> início efetivo em 25/05/2020 (CI = R\$ 2.115.230,03)	Concluída (fiscalização empresa AGP + Eng. Elétrica FAI)	OBS 01: TR Provisório PARCIAL: 01/12/2021 > OBS 02 - TR Provisório INTEGRAL: 20/05/2022	GRIFFO (CI + 1º TA + 1º TA Reequilíbrio + 1º TA Realinhamento + 2º TA + 6º TA)	1.043,20	CNO 90.001.26278/76 (Será o mesmo da CONC 02/2019 rescindida)	2.501.066,39		2.501.066,39	CCET
21	1468 + 9557	CONC 06/2018	MAVLABS - conclusão da obra - abertura das habilitações ocorreu em 02/12/2019 - abertura das propostas em 16/12/2019 - data da assinatura do contrato: 13/05/2020 >> empresa JNA (CI = R\$ 2.167.534,88)	Concluída (fiscalização empresa AGP + Eng. Elétrica FAI)	05/10/2021 (Termo Recebimento Provisório: 27/10/2021)	JNA (CI + 1º TA Reequilíbrio + 1º TA)	993,50	CNO 90.003.49850/60 (está em nome Jomar - 27/05/20)	2.424.437,45		2.424.437,45	CCET
22	1597	CONC 01/2020	Reforma da UGR - DQ - (ilha) - predio 68A - Lab de Destilação (Ab = 100,98 m²) - data de assinatura do contrato/início de obra: 16/09/2020 (CI = R\$ 248.853,55)	Concluída (fiscalização empresa AGP + Eng. Elétrica FAI)	27/08/2021 (Termo Recebimento Provisório: 08/08/2021)	JNA (CI + 1º TA Reequilíbrio + 1º TA + 3º TA)	100,98	CNO 90.004.75553/75	290.706,79		290.706,79	CCET
23	1597	CONC 02/2020	Reforma da UGR/DeGR - predio 114D + deposito existente (Ab = 163,60 m²) + Ampliação da UGR/DeGR (Ab = 82,00m²) - data da assinatura do contrato/início de obra: 16/09/20 (CI = R\$ 575.561,02)	Concluída (fiscalização empresa AGP + Eng. Elétrica FAI)	27/07/2021 (Termo Recebimento Provisório: 23/08/2021)	JNA (CI + 1º TA de Reequilíbrio + 1º TA)	245,60	CNO 90.004.75591/77	616.443,37		616.443,37	CCET
24	RESCISÃO	CONC 04/2020	Reforma das Instalações Elétricas - Predios do DEMA - abertura das propostas comerciais em 30/09/20 - data da assinatura do contrato: 17/11/2020 - data início de obra: 02/12/2020 - Valor CI = R\$ 844.875,01	Rescisão contratual realizada em 11/03/2021 (conv 1556)	11/03/2021	Nasman (Rescindido)	**	CNO 90.005.21881/70	0,00		-	CCET
25	REVOGADA	SI 015/2020 (não FINEP)	PMGCA - Lab Sala de Sementes - abertura das habilitações: 24/11/2020 - Valor Base = R\$ 842.592,49 - data base Jul/20 - Convenio 10.763 (não FINEP)	Seleção Pública revogada em 09/03/2021	09/03/2021	Contratação Revogada	**	**	Convenio 10.763 (recursos privados) - não Finep	0,00	-	CCA
26	RESCISÃO	CONC 03/2020	Genética - Conclusão da obra (conv. 1597 e 11.417) - Valor Base = R\$ 1.473.262,94 (Fev/20) - data de assinatura do contrato: 21/10/2020 - início da obra: 05/11/2020. Valor do Contrato Inicial = R\$ 1.098.140,00	Rescisão contratual realizada em 11/03/2021 (conv. 1597 + 11.417)	11/03/2021	Nasman (Rescindido)	**	CNO 90.005.04383/79	0,00		-	CCBS
27	1481 + 9557	CONC 04/2018	FINEP 2 e 3 de Araras (unificados) - conclusão da obra - abertura da licitação 31/01/2019, abertura das propostas em 13/03/2019 e assinatura do contrato em 16/05/19	Concluída (fiscalização empresa AGP + Eng. Elétrica FAI)	08/09/2020	JNA	1.488,60	CNO 90.000.62787/78	3.361.724,32		3.361.724,32	CCA
28	9557	CONC 05/2018	COLMEEA - conclusão da obra - abertura da licitação 31/01/2019; abertura das propostas: 26/02/19; assinatura do contrato em 21/05/19	Concluída (fiscalização empresa AGP + Eng. Elétrica FAI)	04/09/2020	Nasman	1.242,50	CNO 90.000.63999/75	2.902.697,75		2.902.697,75	INSTITUCIONAL
29	1556	CONC 01/2019	Reforma das Instalações Elétricas da BCO - São Carlos (Ab = 9.000,00 m²) - abertura das habilitações em 23/04/19 >> data da assinatura do contrato e da ata: 28/06/2019 - Início efetivo da obra: 19/07/2019	Concluída (fiscalização Eng. Elétrica FAI)	20/12/2019	Mult Light	reforma instalações elétricas BCO - Ab = 9.000,00 m²	CNO 90.000.98846/70	200.737,65		200.737,65	INSTITUCIONAL
30	1597 + 9557	CONC 10 /2017	NANOBIODQ - Conclusão da Obra - (abertura em 23/06/2017) - Empresa MACRO - assinatura do contrato: 05/09/2017	Concluída (fiscalização empresa AGP + Eng. Elétrica FAI)	04/10/2019	MACRO	2.123,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	3.599.056,71		3.599.056,71	CCET
31	10.763 - não FINEP	SI 009/2018 (seleção pública)	Reforma do Departamento de Biotecnologia e de Produção Vegetal e Animal - DBPVA (profº Bernadete - predio Central) /PMGCA/Araras - abertura 06/11/18, abertura proposta comercial: 14/11/18 >> JNA assinatura contrato: 14/12/2019 - início da obra em 07/01/2019	Concluída (fiscalização empresa AGP + Eng. Elétrica FAI)	27/09/2019	JNA	183,74	CNO 90.000.21841/71	Recurso PMGCA (projeto 10.763) - valor base = R\$ 266.074,70	308.442,27	308.442,27	CCA
32	RESCISÃO	CONC 02/2019 (conv 9557)	LIEP - Conclusão da obra (C. Convite 01/2014) >>> Conclusão do processo de rescisão contratual e emissão do Termo de Recebimento Provisório datados de 24/10/2019	Concluída parcialmente (contrato rescindido) - fiscalização Empresa AGP (conv 9557)	26/09/2019	Costa e Costa Construções	1.043,20	CNO 90.901.26278/76	55.670,48		55.670,48	CCET
33	10.763 - não FINEP	SI 010/2018 (seleção pública)	Reforma do PREDIO PMGCA (sede >> Prof Hermann) /Araras - abertura: 09/11/18; abertura proposta comercial: 14/11/18 >> JNA assinatura contrato: 14/12/2018 - início da obra em 07/01/2019	Concluída (fiscalização empresa AGP + Eng. Elétrica FAI)	21/08/2019	JNA	1.306,30	CNO 90.000.21996/70	Recurso PMGCA (projeto 10.763) - valor base = R\$ 285.714,33	426.908,52	426.908,52	CCA
34	1556	CONC 05 /2017	BCO - S Carlos - REFORMA (abertura 14/06/17) - Empresa Viasol - assinatura do contrato 29/08/2017 início efetivo/ata: 11/09/2017	Concluída (fiscalização empresa AGP + Eng. Elétrica FAI)	06/05/2019	Viasol	reforma	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	677.233,68		677.233,68	INSTITUCIONAL
35	1481 + 9557	CONC 17/2017	FINEP 3 e 4 - SOROCABA - conclusão da obra (abertura em 30/10/17) - assinatura c/ a M&G: 15/12/2017 - início efetivo da obra em 03/01/2018 - M&G	Concluída (fiscalização empresa AGP + Eng. Elétrica FAI)	29/04/2019	M&G - (CI + TAs + Realinhamento)	2.026,40	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	4.096.076,28		4.096.076,28	CCTS
36	1556	CONC 07 /2017	INFRADEC - 1ª etapa (abertura em 20/06/2017) - empresa Contisa - assinatura do Contrato/Ata: 18/08/2017 - convenio 1556	Concluída (fiscalização empresa AGP)	18/04/2019	Contisa	684,60	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	716.808,79		716.808,79	CCET

		Obras executadas e em andamento - período: 2008 à 2024		Obras CTINFRA/FINEP e/ou Outros Convênios		OTC		Posição em: 29/05/2024				
37	1556	CONC 03/2018	Reforma Biblioteca de Sorocaba - reabertura em 01/10/18 - empresa vencedora M&G : contratação em 06/11/2018	Concluída (fiscalização empresa AGP)	21/03/2019	M & G	Ab Biblios - Sorocaba = 1.686,94 m²	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	218.279,18	218.279,18	CCTS	
38	1597	CONC 03 /2017	Genética - CGMB-DGE - 1ª etapa (abertura 13/06/17) - Empresa ALPHA - assinatura contrato: 03/10/17	Concluída (fiscalização empresa AGP + Eng. Elétrica FAI)	11/03/2019	ALPHA - ( CI + TAs + Realinhamento)	1.150,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.963.835,08	1.963.835,08	CCBS	
39	1406+ 1468+ 9557	CONC 09 /2017	BIOTROP - Conclusão da obra (abertura em 22/06/2017) - Empresa MACRO - assinatura do contrato: 04/09/2017	Concluída (fiscalização empresa AGP + Eng. Elétrica FAI)	26/02/2019	MACRO	1.673,83	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.814.545,12	1.814.545,12	CCBS	
40	1416 + 1481	CONC 07 /2016	2ª etapa da obra Lab. FINEP II e III - Araras - Ab = 1.488,60 m² - 1416*01 e 1481*01 (relançamento: abertura da licitação em 21/12/2016 - contrato datado em 03/03/2017 e o início efetivo da obra em 20/03/2017 >> conforme ata - empresa Prodex)	Concluída (fiscalização FAI)	20/12/2018	Prodex	1.488,60	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.642.425,62	1.642.425,62	CCA	
41	1486 + 9557	CONC 14 /2017	CINA - conclusão da obra - abertura 04/10/2017 - assinatura contrato em 27/11/2017 - JNA	Concluída (fiscalização empresa AGP + Eng. Elétrica FAI)	20/12/2018	JNA	634,95	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.136.862,65	1.136.862,65	CCET	
42	1406 + 1468 + 9557	CONC 08 /2017	NAP - conclusão da obra (abertura em 10/07/2017) - Empresa MACRO - assinatura contrato 15/09/2017	Concluída (fiscalização empresa AGP + Eng. Elétrica FAI)	30/11/2018	MACRO	1.876,85	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.530.061,93	1.530.061,93	CECH	
43	1556	CONC 02/2017	BIOTERIO - 1ª etapa - Ab = 512,34 m². (convênio 1556) - abertura da licitação em 07/03/2017 - empresa ARQCON julgada vencedora em 12/04/2017 - contrato assinado em 26/05/17 e início efetivo em 01/06/17	Concluída (fiscalização empresa AGP)	14/09/2018	ARQCON	512,34	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.197.829,15	1.197.829,15	CCBS	
44	8817 - não FINEP	CONC 01/2018	HU - Instalações de Brises do lado oeste - abertura: 15/02/2018 - contrato assinado em 19/03/2018 - Cedro	Concluída (fiscalização EBSE RH - Eng Fabio)	08/08/2018	CEDRO	instalações brises	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	Recurso MS/UFSCAR >> não FINEP	318.102,99	318.102,99	INSTITUCIONAL
45	1556	CONC 13 /2017	IBEV - 1ª etapa (1556) - abertura 06/09/17 - assinatura do contrato c/ BIL: 20/10/17	Concluída (fiscalização empresa AGP)	30/07/2018	BIL	661,39	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	461.617,60	461.617,60	CCBS	
46	1597	CONC 04 /2017	DGR - Nova UGR - 1ª etapa (abertura 12/06/17) - Empresa ARQCON - assinatura do contrato: 02/10/17	Contrato rescindido/obra cancelada	27/07/2018	ARQCON	781,66	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	138.021,99	138.021,99	CCBS	
47	8817 - não FINEP	CONC 16/2017	HU - 3ª licitação >> Execução das Instalações Elétricas - Bloco 02 (Orçamento EBSE RH) - abertura 24/10/2017 - MONTAG	Concluída (fiscalização EBSE RH - Eng Fabio) - Cedro	15/07/2018	MONTAG	inst elétricas	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	Recurso MS/UFSCAR >> não FINEP	356.972,24	356.972,24	INSTITUCIONAL
48	8817 - não FINEP	CONC 15/2017	HU - 2ª licitação >> Execução para complemento da obra civil do Bloco 02 (Orçamento EBSE RH) - abertura 23/10/2017 - Empresa Cedro >> assinatura do contrato: 27/11/2017 - CEDRO	Concluída (fiscalização EBSE RH - Eng Fabio) - Cedro	26/06/2018	CEDRO	1.881,85	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	Recurso MS/UFSCAR >> não FINEP	1.023.728,06	1.023.728,06	INSTITUCIONAL
49	1597	CONC 18/2017	3ª etapa do LIEC - Instalações Elétricas (conclusão da obra - conv 1597) - abertura em 09/11/17 - assinatura do contrato: 06/12/2017 - MONTAG	Concluída (fiscalização eng elétrica FAI) - MONTAG	24/04/2018	MONTAG	inst elétricas	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	172.100,15	172.100,15	CCET	
50	1597	CONC 12 /2017	Cabine de Força Nanobio (Obra Inst.Elétrica) - abertura em 31/08/17 - início efetivo da obra em 03/01/2018 - Sampietro	Concluída (fiscalização eng elétrica FAI) - Sampietro	20/04/2018	SAMPIETRO	inst elétricas	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	179.974,43	179.974,43	CCET	
51	1556	CONC 11 /2017	Reforma das instalações elétricas dos 4 prédios do CECH - abertura 28/08/17 - assinatura contrato: 22/09/2017 - empresa Nova Meta	Concluída (fiscalização eng elétrica FAI) - Nova Meta	16/03/2018	NOVA META	inst elétricas	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	121.117,98	121.117,98	CECH	
52	1597	CONC 06 /2016	2ª etapa da ampliação do Ed. Matemática - Conv 1597*03 (relançamento abertura da licitação em 21/12/2016) - Contrato assinado em 16/01/2017: Ata início de Obra 30/01/2017	Concluída (fiscalização FAI)	23/10/2017	CONTISA	955,28	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	359.616,68	359.616,68	CCET	
53	1468	CONC 04 /2016	1ª etapa prédio MAVLABS /DF c/ 2 pavimentos (GPF 1468) - abertura da licitação: 18/10/2016 (empresa JNA - valor CI = R\$ 934.281,17) - Ata assinada em 09/01/2017	Concluída (fiscalização FAI)	26/10/2017	JNA	993,50	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.006.681,17	1.006.681,17	CCET	
54	8817 - não FINEP	CONC 02/2016	Hospital Universitário - HU - 1ª licitação - reforma e conclusão de parte do prédio - Convênio 9317 - FAI X Sapiens (empresa Pajolla - fiscalização Eng Fabio/EBSE RH) - contrato assinado em 14/09/2016	Concluída (fiscalização EBSE RH)	18/09/2017	PAJOLLA	1.881,85	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	Recurso MS/UFSCAR >> não FINEP	4.955.651,09	4.955.651,09	INSTITUCIONAL
55	1556	CONC 01/2017	Cabine de Força NANOBIO - p/ o prédio de 4 pavimentos (conv 1556 - obra civil) - Abertura das habilitações em 23/02/2017 - vencedora empresa Fragalli - contrato assinado em 04/04/2017 - início efetivo da obra: 10/04/2017	Concluída (fiscalização FAI)	26/07/2017	FRAGALLI	62,10	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	142.937,38	142.937,38	CCET	
56	1468	CONC 05/2016	2 Cabines de Instalações Elétricas p/ o Biotrop e Colmeia - GPF 1468 (abertura da licitação: 15/12/2016 - empresa Sampietro Eng.) - início de obra : 30/01/2017	Concluída (fiscalização FAI)	24/07/2017	SAMPIETRO	126,20	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	598.995,25	598.995,25	CCET	
57	1597	CONC 01/2016	2ª Etapa do LIEC (empresa JNA) - contrato assinado em 03/10/2016 - início efetivo em 17/10/16 - término previsto 15/04/17 - (houve solicitação de aditivo de prazo por + 60 dias solicitado em 02/02/2017)	Concluída (fiscalização FAI)	27/06/2017	JNA	352,02	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	411.991,00	411.991,00	CCET	
58	PRODIN	Contratação Direta (3 orçamentos)	LIEP - contratação da Laje de Piso do 1º pavimento via PRODIN - contrato assinado em 09/01/2017 c/ Habcon - obra concluída (somente escoramento da laje será retirado em 10/03/17)	Concluída (fiscalização FAI)	17/02/2017	HABCON	491,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	Recurso PRODIN/FAI/DEP - UFSCAR	84.635,08	84.635,08	CCET


FAI		Obras executadas e em andamento - período: 2008 à 2024			Obras CTINFRAS/FINEP e/ou Outros Convenios		OTC		Posição em :		29/05/2024	
59	não FINEP	CONC 07/2015	Lab Ed. Física e Motricidade Humana - GPF 1325*01 (custo final da obra = soma dos pagamentos à JBS = CONC 22/2013 e dos pagamentos à JNA = CONC 07/2015)	Concluída (fiscalização FAI)	21/12/2016	JBS/JNA	1.250,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	Recurso CCI 098/2007 >> convenio encerrado em 28/12/2016	4.395.669,24	4.395.669,24	CCBS
60	1468	CONC 01/15	1ª Etapa do Edifício do LIEP (3 pav - em estrutura metálica)	Concluída (fiscalização FAI)	08/11/2016	Dalmetal	1.623,40	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.388.746,65		1.388.746,65	CCET
61	RESCISÃO	CONC 06/2015	3ª Etapa BIOTROP - empresa Zaccarelli - CONTRATO RESCINDIDO EM SET/2016	Concluída parcialmente (contrato rescindido - fiscalização FAI)	09/09/2016	Zaccarelli	1.673,83	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	268.498,51		268.498,51	CCBS
62	RESCISÃO	CONC 03/15	Ampliação Ed. Matemática 1ª etapa - Empresa Zaccarelli - CONTRATO RESCINDIDO EM SET/2016	Concluída parcialmente (contrato rescindido - fiscalização FAI)	09/09/2016	Zaccarelli	955,28	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	744.138,96		744.138,96	CCET
63	RESCISÃO	CONC 05/15	2ª etapa Nanobio - 4 pavimentos [ etapa para termino somente de 2 pavimentos] - Empresa Zaccarelli - Obs: contrato rescindido em Ago/2016	Concluída parcialmente (contrato rescindido - fiscalização FAI)	26/08/2016	Zaccarelli	1.061,50	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	202.934,43		202.934,43	CCET
64	1468	CONC 04/15	Reforma MAVLABS - DF - ata inicio da obra: 15/01/2016	Concluída (fiscalização FAI)	09/08/2016	Simieng	170,07	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	254.014,63		254.014,63	CCET
65	1468	TPN 01/2015	3 Cabines de Dados e Voz em 5 Carlos - GPF 1468*02 (5 açoes) - Cabines de Letras, do DECIV e do CCBS	Concluída (fiscalização FAI)	07/04/2016	**	180,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	230.994,10		230.994,10	INSTITUCIONAL
66	1406	CV 06/15	Reforma do Laboratório de Controle Ambiental 01 (Edifício nº 75 - DEQ)	Concluída (fiscalização FAI)	23/02/2016	**	132,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	65.752,77		65.752,77	CCET
67	não FINEP	SL 001/2015	2º Predio Administrativo FAI (FAI 02) - recursos proprios	Concluída (fiscalização FAI)	17/12/2015	**	379,40	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	Recurso FAI >> não FINEP	1.128.932,54	1.128.932,54	FAI (2º predio administrativo)
68	1406	CONC 23/13	4ª etapa do DEQ - São Carlos (empresa JBS)	Concluída (fiscalização FAI)	10/09/2015	**	1.542,02	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.352.990,00		1.352.990,00	CCET
69	1406	CONC 03/14	2ª. Etapa do NAP	Concluída (fiscalização FAI)	16/06/2015	**	1.876,75	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.343.697,06		1.343.697,06	CECH
70	1406	CONC 21/13	Construção da 1ª etapa - COLMEEA	Concluída (fiscalização FAI)	24/04/2015	**	1.242,50	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.497.468,67		1.497.468,67	INSTITUCIONAL
71	RESCISÃO	CONC 19/13	1ª etapa Finep II e III de Araras - (executada parcialmente c/ a empresa JBS mas contrato - CONC 019/2013 - foi revogado - Valor Pago até 27/02/15 = R\$ 230.064,26)	Concluída parcialmente (contrato rescindido)	27/02/2015	JBS	1.488,60	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	230.064,26		230.064,26	CCA
72	RESCISÃO	CONC 02/14	Construção 2ª etapa BIOTROP (executada parcialmente c/ a empresa JBS mas contrato foi revogado)	Concluída parcialmente (contrato rescindido)	27/02/2015	**	1.673,83	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	333.191,92		333.191,92	CCBS
73	*	CONC 07/14	Reforma dos Lab. DEQ - predios 34 e 34B	Concluída (fiscalização FAI)	25/10/2014	**	122,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	136.357,22		136.357,22	CCET
74	1481	CONC 15/13	1ª etapa FINEP 3 e 4 - Sorocaba - empresa JBS - Fiscal Cassio/Sorocaba	Concluída (Fiscal - Eng Cassio - Sorocaba)	05/09/2014	**	2.026,40	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	2.288.577,36		2.288.577,36	CCTS
75	1406	CONC 16/13	Execução de Rede Compacta e Subterrânea - Transfederonica - 5 Carlos	Concluída	14/07/2014	**	inst eletrica	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	712.637,48		712.637,48	INSTITUCIONAL
76	*	TPN 010/13	Cabine de Força - Araras (p/ atender os predios FINEP 1, 2 e 3) - Eletro Pires - Fiscal Arquelau	Concluída	13/07/2014	**	52,56	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	173.531,61	34.252,17	207.783,78	CCA
77	1406	CONC 17/13	Construção 1ª etapa do CINA - 5 Carlos	Concluída	25/06/2014	**	634,95	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	570.243,23		570.243,23	CCET
78	1295*03 + 1551*01	CONC 13/13	2ª Etapa Ecotoxicologia - Araras - Empresa JBS - Fiscal Arquelau	Concluída	29/05/2014	**	746,32	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	610.974,12	167.540,49	778.514,61	CCA
79	não FINEP	DL 04/11	Predio Sêde - PMGCA - Araras	Concluída	05/05/2014	**	1.306,30	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	Recursos PMGCA	3.116.398,39	3.116.398,39	
80	1371	CONC 05/12	Construção 1ª etapa BIOTROP ( Empresa Zaccarelli)	Concluída	24/01/2014	**	1.673,83	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.364.445,15		1.364.445,15	CCBS
81	*	CONC 12/13	Construção da 1ª etapa do LIEC - Prof Ernesto DQ	Concluída	30/12/2013	**	352,02	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	441.352,11		441.352,11	CCET
82	1371	CONC 11/13	Construção Ed Núcleo de Apoio a Pesquisa - NAP - 1ª etapa	Concluída	08/12/2013	**	1.876,85	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.134.734,26		1.134.734,26	CECH
83	*	CONC 03/11	Construção Lab Educ. Especial - 1ª etapa - Psicologia - CONC 003/11	Concluída	12/11/2013	**	1.121,75	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	711.142,24	1.079.573,93	1.790.716,17	CECH
84	*	CONC 10/13	Reformas e adequações LIDEPS (edif 23, 25 e 15B)	Concluída	20/10/2013	**	578,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	607.801,60		607.801,60	CECH
85	1406	CONC 01/13	3ª Etapa do DEQ - Inst. Eletricas	Concluída	17/10/2013	**	inst eletrica	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	456.579,02		456.579,02	CCET

Obras executadas e em andamento - período: 2008 à 2024		Obras CTINFRAS/FINEP e/ou Outros Convenios		Posição em: 29/05/2024								
86	1295*03 + 1551*01	CONC 04/12	Construção Lab. Biotecnologia e Ecotoxicologia, 1ª Etapa - Araras - ENGE REIS - fiscal Pavan	Concluída	21/06/2013	**	746,35	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	438.288,87	3.235,04	441.523,91	CCA
87	*	TPN 01/12	Reforma da Cobertura do Edifício LCE	Concluída	27/05/2013	**	388,32	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	199.693,87	145.943,52	345.637,39	CCET
88	1202	CONC 02/12	Construção 1ª etapa Nanobio - DQ - 4 pav	Concluída	16/05/2013	**	2.123,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.180.644,82	402.240,41	1.582.885,23	CCET
89	*	TPN 011/12	2ª Etapa Cabine da Sin -	Concluída	08/02/2013	**	62,21	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	151.409,56		151.409,56	INSTITUCIONAL
90	Recursos conv 1202	CONC 01/2009	1ª Etapa do Centro de Pesquisa / Petrobras (convenio 1202*02 - Prof Ernesto Urquieta)	Concluída	31/01/2013	**	3.600,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	Recursos PETROBRAS	7.704.956,35	7.704.956,35	CCET
91	1287 + 1202 + 1550	CONC 04/11	Construção 2ª Etapa DEQ + Entorno - CONC 004/11	Concluída	22/10/2012	**	1.542,02	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	340.943,27	137.760,56	478.703,83	CCET
92	*	TPN 09/11	Construção de cabine primária - SIN - 1ª Etapa	Concluída	03/05/2012	**	62,21	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	104.066,58		104.066,58	INSTITUCIONAL
93	*	TPN 07/11	Modernização Cab. Entrada E. Elétrica	Concluída	07/04/2012	**	inst eletrica	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	50.299,70		50.299,70	CCA
94	1325 (CCI) + 1371 + 1406	CONC 05/10	Construção da cobertura do Edifício da Matemática - conv 1325/CCI nº 098/2007 = R\$ 1.374.516,77 + conv 1371/FINEP = R\$ 390.000,00 + 1406/FINEP = R\$ 877.433,68	Concluída	04/03/2012	**	3.276,50	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.267.433,68	1.374.516,77	2.641.950,45	CCET
95	*	TPN 08/11	Reforma da Rede de Média Tensão em Araras	Concluída	15/01/2012	**	inst eletrica	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	21.404,67		21.404,67	CCA
96	*	CONC 01/11	Reforma e Ampliação do Lab. de Alta Pressão - DEQ	Concluída	15/12/2011	**	34,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	86.233,89		86.233,89	CCET
97	*	CONC 01/10	Acabamento e Instalações do ATLab - Sorocaba - / GROUT	Concluída	20/09/2011	**	8.740,08	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	677.312,79	3.393.538,92	4.070.851,71	CCTS
98	*	CN 03/11	Execução e Conclusão da rede de Telefonia e Dados do Laboratorio	Concluída	03/07/2011	**	inst eletrica	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	49.984,44		49.984,44	CCET
99	Recursos conv 1325	CONC 04/2009	Fundação e Estrutura Pre Fabricada do Ed Matemática - empresa PROTENDIT - CCI 098/2007 - GPF 1325 - 01	Concluída	17/02/2011	Protendit	3.276,50	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	Recursos CCI 098/2007 (não FINEP)	2.120.582,97	2.120.582,97	CCET
100	*	TPN 017/08	Reforma Lab do Ed 51 - CCET - Depto Fisica (Unimaz)	Concluída	25/10/2010	**	617,17	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI		374.014,00	374.014,00	CCET
101	*	CONC 04/08	Ed. DEQ - 1ª etapa	Concluída	03/01/2010	**	1.534,60	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.511.883,44		1.511.883,44	CCET
102	*	CONC 06/08	Ed. Fisioterapia - 1ª etapa - fundação e estrutura pré moldada	Concluída	25/07/2009	**	3.300,55	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	1.990.281,10	12.000,00	2.002.281,10	CCBS
103	*	TPN 06/08	Lab Pesquisa de Exatas - Sorocaba - 2ª Etapa	Concluída	23/05/2009	**	528,91	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	357.860,17	242.477,33	600.337,50	CCTS
104	*	CN 03/08	Reforma e Ampliação Lab Controle Ambiental - DEQ	Concluída	16/02/2009	**	132,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	120.378,58		120.378,58	CCET
105	*	Dis 01/08	Reforma e Ampl. Lab. Engº Bioquímica - DEQ (CN 010/08)	Concluída	17/01/2009	**	110,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	48.508,76	18.466,44	66.975,20	CCET
106	*	TPN 016/07	Obras/Reformas Ed 51 e 52 - Depto Fisica	Concluída	03/10/2008	**	2.086,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	617.830,65		617.830,65	CCET
107	*	CN 017/08	Reforma Lab do Ed 53 - Depto Fisica	Concluída	12/09/2008	**	250,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	22.974,72		22.974,72	CCET
108	*	TPN 02/07	Lab Pesquisa Sorocaba - Fundações/Estrutura - 1ª Etapa	Concluída	21/03/2008	**	528,91	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	299.849,56		299.849,56	CCTS
109	*	TPN 008/07	Lab Microscopia Elettronica/Conclusão - S Carlos	Concluída	11/03/2008	**	434,00	INSS: recolhimento sobre o CNPJ da Empresa ou CEI	404.405,31		404.405,31	CCET
<b>Tt =</b>							<b>96.570,13</b>		<b>74.504.454,59</b>	<b>40.874.835,32</b>	<b>115.379.289,91</b>	

Posição: 29/05/2024


Obras executadas e em andamento - período: 2008 à 2024		
	R\$	% rel
Convenios FINEP =	74.504.454,59	64,57%
Recursos CCIs / Próprios/Outras Fontes =	40.874.835,32	35,43%
<b>Total (R\$) =</b>	<b>115.379.289,91</b>	<b>100,00%</b>

>>>>>>




Posição em : 29/05/2024

ano	Obras Concluídas/Licitadas/em andamento - (R\$/ano)
2008 - concluídas	1.345.060,24
2009 - concluídas	2.789.972,38
2010 - concluídas	1.885.897,44
2011 - concluídas	6.327.653,01
2012 - concluídas	3.296.425,23
2013 - concluídas	14.657.595,60
2014 - concluídas	9.174.957,22
2015 - concluídas	5.886.344,45
2016 - concluídas	7.550.749,29
2017 - concluídas	7.560.507,65
2018 - concluídas	8.278.814,79
2019 - concluídas	14.077.593,76
2020 - concluídas	6.264.422,07
2021 - concluídas	3.331.587,61
2022 - concluídas	5.982.373,49
2023 - concluídas	4.465.099,12
2024 - concluídas	1.228.171,50
2024 - em andamento	6.463.282,11
2024 - em licitação/prazo recursal	3.046.637,96
2024 - em fase de contratação	164.994,61
2024 - em montagem de edital	1.601.150,38
2024 - em orçamentação	-
<b>Tt Geral - R\$</b>	<b>115.379.289,91</b>

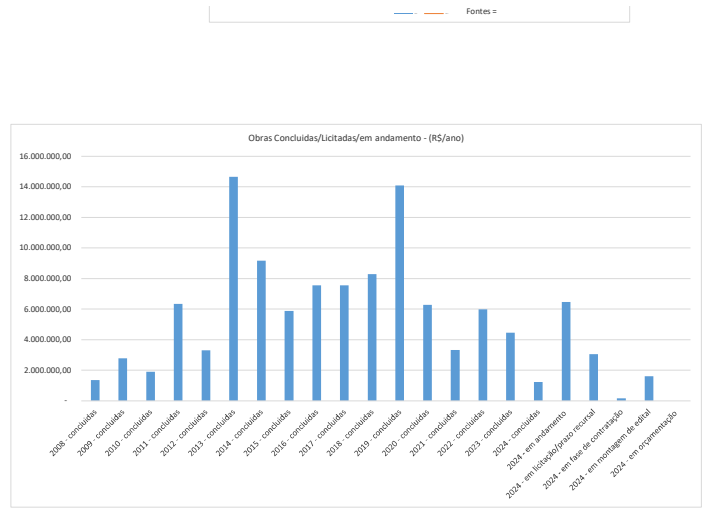

ano	Agrupamento de Obras Concluídas e/ou em andamento (R\$/ano)
2008	1.345.060,24
2009	2.789.972,38
2010	1.885.897,44
2011	6.327.653,01
2012	3.296.425,23
2013	14.657.595,60
2014	9.174.957,22
2015	5.886.344,45
2016	7.550.749,29
2017	7.560.507,65
2018	8.278.814,79
2019	14.077.593,76
2020	6.264.422,07
2021	3.331.587,61
2022	5.982.373,49
2023	4.465.099,12
agrupadas 2024	12.504.236,56
<b>Tt Geral - R\$</b>	<b>115.379.289,91</b>

>>>>>>>

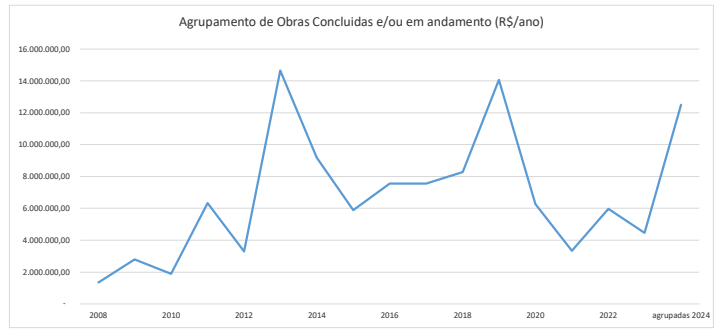

**Obs 01: Recursos para obras a serem liberados pela FINEP :**

Posição: 29/05/2024

Conv. GPF/Sapiens/FINEP	Recursos ainda a serem liberados /contratos vigentes (R\$)	% a ser liberado para Obras	data assinatura	vencimento atual do convenio
1416 - 01.09.0476.00	Encerrado - RTF em set/2021	recurso totalmente liberado	09/10/2009	Encerrado - RTF em set/2021
1481 - 01.11.0055.00	Encerrado - RTF em jul/2022	recurso totalmente liberado	23/03/2011	Encerrado - RTF em jul/2022
1406 - 01.09.0354.00	Encerrado: RTF >> fev/23	Ultima parcela liberada em jun/2014	09/09/2009	Encerrado: RTF >> fev/23

Conv. GPF/Sapiens	Valores a serem liberados
1416	Encerrado - RTF em set/2021
1481	Encerrado - RTF em jul/2022
1406	Encerrado: RTF >> fev/23

Obras executadas e em andamento - período: 2008 à 2024 Obras CTINFRAS/FINEP e/ou Outros Convênios Posição em : **29/05/2024**

Identificador	Encerrado: RTF >> Out 2023	recurso totalmente liberado em dez/2019	18/12/2018	Encerrado: RTF >> Out 2023
11.417 - 01.18.0153.00 (Carta Convite 01/2018)				
1597 - Sapiens 1158 01.12.0510.00	Encerramento em Dez/23 com RTF enviado em Abr/2024	Ultima parcela liberada em Dez/2016	21/12/2012	21/12/2023 - não será prorrogado - RTF até Fev/24
11.542 - 01.19.0189.00 (CTINFRA 03/2018 - Reformas 8 Biotérios de Apoio)	249.500,00	100,00%	22/12/2019	20-dez-24
1468 - Sapiens 1549 01.10.0625.00	zero	Ultima parcela liberada em Jul/2016	01/12/2010	01-dez-24
1556 - Sapiens 595 01.12.0048.00	zero	recurso totalmente liberado (saldo desbloqueado em jan/23)	09/02/2012	09-fev-25
9557 - 01.16.0014.00 (Carta Convite 01/2014)	zero	recurso totalmente liberado em mar/2024 (valor ultima parcela = R\$ 434.450,36)	19/04/2016	09-fev-25
15.481 - 01.23.0061.00 (Salas Limpas)	zero	Valor total liberado em julho/2023 (R\$ 193.931,48 p/ reforma)	26/06/2023	26-jun-25
<b>Tt - R\$</b>	<b>249.500,00</b>			


Identificador	Encerrado: RTF >> Ago 2023
11.417 - 01.18.0153.00 (Carta Convite 01/2018)	
1597	Encerramento em Dez/23 com RTF enviado em Abr/2024
11.542 - 01.19.0189.00 (CTINFRA 03/2018 - Reformas 8 Biotérios de Apoio)	249.500,00
1468	recurso totalmente liberado
1556	recurso totalmente liberado (saldo desbloqueado em jan/23)
9557 - 01.16.0014.00 (Carta Convite 01/2014)	recurso totalmente liberado
15.481 - 01.23.0061.00 (Salas Limpas)	recurso totalmente liberado
<b>Tt - R\$</b>	<b>249.500,00</b>

Encerrado: RTF >> Out 2023  
21/12/2023 - não será prorrogado - RTF até Fev/24

**Obs 02: Área Construída/Licitada por ano**

Posição: 29/05/2024

ano	Área Construída - concluídas e/ou licitadas (m²) por ano
2008	3.298,91
2009	4.071,46
2010	1.534,60
2011	8.774,08
2012	4.880,73
2013	10.848,50
2014	6.562,36
2015	8.203,10
2016	7.046,08
2017	4.861,95
2018	7.837,64
2019	10.191,07
2020	2.731,10
2021	2.021,00
2022	2.854,59
2023	2.251,89
2024 - concluída	-
2024 - em andamento	4.480,99
2024 - em contratação	85,21
2024 - em licitação	-
2024 - em orçamentação	-

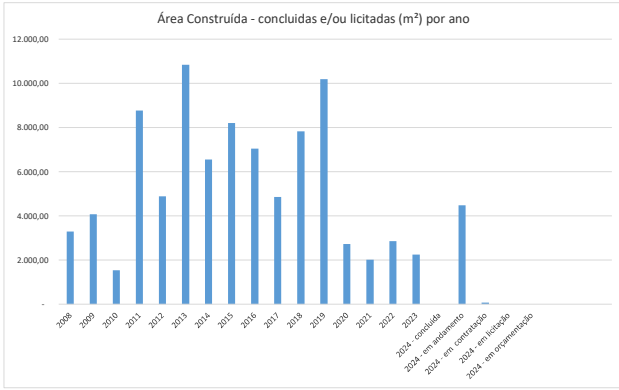

**Obs 03: Obras a serem licitadas a partir de 2023**

Posição: 29/05/2024

qte	GP/Suplento - FAI	Obras a serem Licitadas a partir de 2023 alem das que estão em orçamentação	Nº FINEP	Status Orçamentos/Liberações	OBS	Projeção/estimativa do valor da obra (R\$)
1	Reformas prédios 83 e 83 A do Depto Botânica x CIVISA	CIVISA - FINEP - PROINFRA 02/2010 (SUB 03 - CIVISA - conv 1556) x reformas prédios da Botânica sob nºs 83 e 83A	Predio 83 (R\$ 600.710,17) e 83 A (R\$ 514.722,62)	Licitação e Recursos via Emenda x UFSCAR >> contratação até Dez/2023?	**Projetos e orçamentos foram elaborados pela Engenharia FAI	1.115.432,79
2	11.542 - Ctinra 03/2018 - Reformas Biotérios - 01.19.0189.00	Unidade 07 de Experimentação do Biotério Central (Fisioterapia)	11.542 - Ctinra 03/2018 - Reformas Biotérios - 01.19.0189.00	aguardando liberação de recurso/FINEP	Para o Biotério 07 ficou somente R\$ 22.800,00 dos R\$ 52.000,00 aprovados	22.800,00
3	11.542 - Ctinra 03/2018 - Reformas Biotérios - 01.19.0189.00	Unidade 08 de Experimentação do Biotério Central (DPsi - CECH)	11.542 - Ctinra 03/2018 - Reformas Biotérios - 01.19.0189.00	aguardando liberação de recurso/FINEP	**Aprovado em 28/01/2019	17.500,00
4	Concorrer em Edital Finep à ser lançado até dez/23?	CEPAR - Centro de Pesquisa em Agricultura Regenerativa - Campus Lagoa do Sino	Replica IBEV em Buri	Aguardando lançamento do Edital/FINEP	** Confirmar com o Coordenador FINEP	3.456.000,00

Obras executadas e em andamento - período: 2008 à 2024 Obras CTINFRAS/FINEP e/ou Outros Convenios Posição em : 29/05/2024

5	Concorrer em Edital Finep à ser lançado até dez/23?	TILSP - CECH x CIVISA	Replica CIVISA em São Carlos	Aguardando lançamento do Edital/FINEP	** Confirmar com o Coordenador FINEP	3.370.000,00
6	Concorrer em Edital Finep à ser lançado até dez/23?	TILSP - CECH x LABPE	Replica LABPE em São Carlos	Aguardando lançamento do Edital/FINEP	** Confirmar com o Coordenador FINEP	4.470.000,00
						12.451.732,79
